

Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації)
державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 31.12.2021

(число, місяць, рік)

Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря

по вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м. Києва

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний університет «Києво-Могилянська академія»
3. Найменування замовника Національний університет «Києво-Могилянська академія»
4. Найменування балансоутримувача Національний університет «Києво-Могилянська академія»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. гривень) 199 831,8.
6. Назва бюджетної програми 2201240 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м. Києва»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) на 2021 рік 15 000,0
8. Інформація щодо проектної організації Інститут «УкрНДІпроектреставрація»
9. Інформація щодо підрядної організації ТОВ «Тауріс»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Наявна		Наявна			

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³	Фактичні показники ⁷	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵

	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1.Проектні роботи		0,000		-		

2. Проведення процедури закупівлі щодо:		19 760,000		18 210,000		
2.1. будівельних робіт в т.ч.:		18 215,600		12 294,974		
Інші реставраційні роботи (в т.ч. фасадів)	4-12.2021	6 600,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1 від 08.05.2019.	-	Договір на весь період робіт. Згідно затвердженого помісячного плану фінансування	
Улаштування внутрішніх інженерних мереж (ОВ, ел., слаботочка)	4-12.2021	6 405,600	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1 від 08.05.2019	-	Договір на весь період робіт. Згідно затвердженого помісячного плану фінансування	
Улаштування зовнішніх інженерних мереж	4-12.2021	1 150,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1 від 08.05.2019	-	Договір на весь період робіт. Згідно затвердженого помісячного плану фінансування	
Загальнобудівельні роботи (в інтер'єрах)	4-12.2021	4000,00	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1 від 08.05.2019	-	Договір на весь період робіт. Згідно затвердженого помісячного плану фінансування	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	4-12.2021	640,200	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1 від 08.05.2019	4 294,657	Договір на весь період робіт. Згідно затвердженого помісячного плану фінансування	
2.3. інших заходів		904,200		990,369		

Утримання служби замовника включно з технаглядом	1-12.2021	499,800	Договір №17, 14.5.19-15.5.22, Додаткові угоди №6,7	499,800	Згідно затвердженого помісячного плану фінансування.
Науково-технічний супровід	1-12.2021	50,000		-	-
Авторський нагляд за роботами	1-12.2021	200,000	Договір №370, 17.5.19-27.12.22 Додаткова угода №4,5	134,460	Договір на весь період робіт. Згідно затвердженого помісячного плану фінансування, зменшення договору через неможливість нагляду у зв'язку з карантинними заходами
Інші витрати	1-12.2021	154,400	Договір №441 ПКВ від 10.11.2020, Договір №469 АВ від 24.06.2021, Договір №649/КТМ-22-21 від 29.06.2021, Договір №97-А-21 від 30.07.2021, Договір №482-АВ від 25.10.21, Договір №2021052066 від 08.11.21, Договір №12/01-1 від 01.12.21	356,109	Договори на додаткові проектні роботи, Договір на технологічні роботи на ділянках теплових мереж, Договір на здійснення археологічних досліджень, Договір КП «Киїблогоустрій, Договір з надання послуг з приєднання
3. Разом (1 + 2) в т.ч.:		19 760,000		18 210,000	
<i>за КПК 2201240</i>		15 000,000		15 000,000	
<i>Інші надходження (спец.фонд)</i>		4 760,000		3 210,000	

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсяга х ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
2. Виконання усього, у тому числі:		19 760,000		18 209,181		
2.1. будівельних робіт		18 215,600		12 924,155		
Інші реставраційні роботи (в т.ч. фасадів)	4-12.2021	6 600,000	4-12.2021	7 906,371	Збільшення вартості у зв'язку з виявленням додаткових робіт	
Улаштування внутрішніх інженерних мереж (ОВ, ел., слаботочка)	4-12.2021	6 405,600	4-12.2021	541,119	Обсяги уточнені виходячи з наявного фінансування	
Улаштування зовнішніх інженерних мереж	4-12.2021	1 150,000	4-12.2021	1 149,869	Збільшення вартості у зв'язку з інфляцією	
Загальнобудівельні роботи (в інтер'єрах)	4-12.2021	4000,00	4-12.2021	3 326,796	Обсяги уточнені виходячи з наявного фінансування	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	4-12.2021	640,2	4-12.2021	4 294,657	Зміна в технологічному порядку виконання робіт	
2.3. інших заходів		904,200		990,369		
Утримання служби замовника включно з технаглядом	1-12.2021	499,800	1-12.2021	499,800		
Науково-технічний супровід	1-12.2021	50,000	1-12.2021	0		
Авторський нагляд за роботами	1-12.2021	200,000	1-12.2021	134,460		
Інші витрати	1-12.2021	154,400	1-12.2021	356,109	Збільшення вартості у зв'язку з виявленням додаткових робіт	
3. Разом (1 + 2) за КПК 2201240		19 760,000		18 209,181		
Інші надходження (спец.фонд)		15 000,000		15 000,000		
		4 760,000		3 209,181		

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
19 760,0		974,2	1 108,1	2 748,1	2 693,7	1 474,4	2 761,5	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
15 000,0 (план)	0	0	0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0
15 000,0 (факт)	0	0	0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0
Касові видатки загальний фонд												
КПК 2201240 15 000,000	0	0	0	426,360	118,361	1 344,363 3000,0(аванс)	885,346 1020,0 (аванс)	124, 747	1 266,277	1 540,758	3 431,940	1 841,848
Касові видатки спеціальний фонд												
КПК 2201160 3 209,181	0	0	0	230,096		1010,222 540,0 (аванс)		1369,647	56,430	2,78555		

Додаток: 1. Копія паспорта бюджетної програми

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹.

3. Копія титулу об'єкта.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2021 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства).

5. Фотографії об'єкта¹⁰.

6. План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік

В.о. президента НаУКМА (найменування посади
керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)

Заступник міністра освіти і науки

(найменування посади уповноваженого керівника
структурного підрозділу головного розпорядника
бюджетних коштів)



(підпис)

М. П.

Гуменна О.В.
(ініціали та прізвище)

Даниленко С.В.
(ініціали та прізвище)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10 03 2021 р.

м. Київ

№ 305


Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2020 року № 166 «Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2020 року за № 388/34671, урахувавши лист Міністерства фінансів України від 09 березня 2021 року № 06050-12-5/7397 про погодження проекту паспорта бюджетної програми,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2201240 «Реалізація державного інвестиційного проекту “Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва”», що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Даниленко С.

Г. в. о. Міністра


З оригіналом
згідно



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

10 03 2021 № 305

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

- | | | |
|----|------------|--|
| 1. | 220 | Міністерство освіти і науки України |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2201000 | Апарат Міністерства освіти і науки України |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2201240 | 0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва" |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 15 000,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

3 оригіналом
згідно



1 Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

7. Мета бюджетної програми:

Збереження та реставрація Староакадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря (пам'ятки архітектури (охор №15/1) та історії (260025-Н) національного значення) по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва, його пристосування для використання університетом і громадою м. Києва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Будівельні роботи, а саме ремонтно-реставраційні (включно з пусконаладжувальними)	13 455,6		13 455,6
2	Придбання обладнання, устаткування, інвентарю та меблів тощо	640,2		640,2
3	Адміністративні витрати, інші витрати (технічний нагляд, науково-технічний супровід, авторський нагляд, археологічний нагляд за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)	904,2		904,2
Всього		15 000,00		15 000,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат					
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	199 831,8		199 831,8

З оригіналом згідно



2	Загальна площа, яка потребує проведення будівельних (ремонтно-реставраційні) робіт (включно з пусконаладжувальними)	кв. м.	державний інвестиційний проєкт, проєктно-кошторисна документація	2 719,0	2 719,0
3	Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж теплопостачання, яка потребує прокладання	м.	проєктно-кошторисна документація	133,0	133,0
4	Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж електропостачання, яка потребує прокладання	м.	проєктно-кошторисна документація	185,0	185,0
5	Загальна довжина зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, яка потребує прокладання	м.	проєктно-кошторисна документація	63,0	63,0
6	Загальна довжина внутрішніх інженерних мереж теплопостачання, яка потребує прокладання	м.	проєктно-кошторисна документація	3 800,0	3 800,0
7	Загальна площа інтер'єру, яка потребує загальбудівельних робіт	кв. м.	проєктно-кошторисна документація	2 719,0	2 719,0
8	Загальна площа фасаду, яка потребує реставрації	кв. м.	проєктно-кошторисна документація	3 311,0	3 311,0
2 продукту					
1	Площа будівлі, на якій виконані будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи	кв. м.	проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 719,0	2 719,0
2	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж теплопостачання	м.	проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	47,5	47,5
3	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання	м.	проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	185,0	185,0
4	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення	м.	проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	63,0	63,0
5	Довжина прокладених внутрішніх інженерних мереж теплопостачання	м.	проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 800,0	3 800,0


3 оригіналом згідно



с.п.п. Я.З.


6	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж, на яких здійснено археологічний нагляд	м.	4 проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	110,5	110,5
7	Кількість проведених спостережень з технічного нагляду	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,0	12,0
8	Кількість придбаного обладнання	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
9	Кількість проведених спостережень з авторського нагляду	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	123,0	123,0
10	Площа інтер'єру будівлі, на якій проведено загальнобудівельні роботи	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	790,0	790,0
11	Площа фасадів будівлі, на якій проведено реставрацію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	442,8	442,8
3 ефективності					
1	Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж теплопостачання	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8 421,0	
2	Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 621,6	
3	Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 142,8	
4	Середні витрати на 1 м прокладених внутрішніх інженерних мереж теплопостачання	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 685,7	
5	Середні витрати на 1 кв.м. площі інтер'єру, на якій виконано загальнобудівельні роботи	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 063,3	
4 якості					

3 оригіналам
згідно



1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	29,4
2	Рівень виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	39,1
3	Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж теплопостачання	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж електропостачання	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
5	Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
6	Рівень виконання робіт із улаштування внутрішніх інженерних мереж теплопостачання	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	18,5
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
8	Рівень виконання загальнобудівельних робіт з інтер'єрів	відс.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16,7
9	Рівень виконання реставраційних робіт на фасадах	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0
10	Рівень виконання адміністративних, інших витрат (технічного нагляду, науково-технічного супроводу, авторського нагляду, археологічного нагляду за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	

3 оригіналом
згідно



Людмила Р. П.

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата №

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власно ім'я ПРІЗВИЩЕ)



З оригіналом
згідно

*Даниленко С.В. отець.
Д.І.І.*

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства освіти і науки України за КПКВК 2201240
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація
Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по
вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва»

Заступник Міністра фінансів України

Олександр КАВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000021BE2F00202B8700

Підписувач Кава Олександр Степанович

Лійський з 13.08.2020 0:00:00 до 13.08.2023 23:59:59

Міністерство фінансів України



ТИТУЛ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міністра
(посада) (підпис)

Даниленко С.В.
(ініціали та прізвище)



Г.в.о.президента НаУКМА
(посада) (підпис)

Ожогов М.М.
(ініціали та прізвище)



"22" березня 2021 р.

"22" березня 2021 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження Реставрація та пристосування Староакадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря (пам'ятка архітектури (охор.№15/1) та історії (охор. № 260025-Н) національного значення)	Частка державної власності у майні замовника на 2021 р., 100% відсотків
Найменування замовника Національний університет «Києво-Могилянська академія»	Наявність робочої документації - розроблена
Галузь - освіта	Кошторисна вартість 172 391,021 тис. грн., у тому числі : будівельних робіт 84 421, 654 тис. грн.
Сфера управління – Міністерство освіти і науки	Ким, коли затверджено проектну документацію – Наказ МОН №430 від 02.04.2019 р.
Характер будівництва - реставрація	Генеральна проектна організація - УкрНДІпроектреставрація
Строки будівництва – 2019-2023	
Джерела фінансування – кошти державного бюджету, інші джерела	Генеральна підрядна організація – переможець тендера – ТОВ «Тауріс»

тис. гривень

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 2021 р.	Профінансовано на 1 січня 2021 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками		Введення в дію (квартал) 2023
					2021	2022	
A	1	2	3	4	5	6	7
Потужність (у відповідних одиницях виміру)							
Вартість основних фондів, тис. гривень							
Капітальні вкладення, тис. гривень							
Загальна кошторисна вартість, у тому числі:	172 391,021	29 872,393	29 872,393	142 518,628	19 760,00	51 799,00	70 959,628
будівельних робіт	84 421,654	24 226,634	24 226,634	60 195,020	18 215,600	33 727,400	8 252,020
устаткування, меблів та інвентарю	51 824,679			51 824,679	640,200	16 000,000	35 184,479
інші витрати	36 144,688	5 645,759	5 645,759	30 498,929	904,200	2 071,600	27 523,129
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. грн:							
державного бюджету-	152 421,428	22 823,867	22 823,867	129 597,561	15 000,000	51 799,000	62 798,561
місцевого бюджету -	-	-	-	-	-	-	-
інших джерел -	19 969,593	7 048,526	7 048,526	12 921,067	4 760,000	-	8 161,067

"__" _____ 2020 р.

Віце-президент з економіки
та фінансів
(посада)

М.М. Ожогов
(підпис)

Дяченко Л.І.
(ініціали та прізвище)

Довідка
щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за державним
інвестиційним проектом «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю
Братського монастиря»
станом на 31.12.2021

За державним інвестиційним проектом за КПК 2201240 на 2021 рік передбачено асигнувань по загальному фонду на 15 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2021 профінансовано по загальному фонду 15 000 000,00 грн.

Станом на 31.12.2021 проведено касових видатків по загальному фонду за програмою КПК 2201240 на 15 000 000,00 грн.

Протягом 01.01.2021 – 31.12.2021 виконувались роботи і надано акти виконаних робіт: за КПК 2201240 (роботи виконувались постійно протягом року згідно плану фінансування) - на суму 15 000 000,00 грн. в т.ч.:

- будівельних робіт – 14 009 630,99 грн.;
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 – 14 009 630,99 грн.
- технічний нагляд за роботами – 499 800,00 грн.;
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 – 499 800,00 грн.
- авторський нагляд за роботами – 134 460,00 грн.;
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 – 134 460,00 грн.
- додаткові проектні роботи – 277 885,60 грн.;
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 – 277 885,60 грн.
- інші витрати замовника – 78 223,41 грн.
з них, сплачено в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 – 78 223,41 грн.

Станом на 31.12.2021 по спеціальному фонду за програмою КПК 2201160 за іншим власним надходженням надано акти виконаних робіт на суму 3 209 177,76 грн., які сплачені в повному обсязі.

Всього наявних актів виконаних робіт: 18 209 177,76 грн.

В.о. президента

Головний бухгалтер



О.В. Гуменна

Ю.А. Зорін

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на 2021 рік

Видана МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

13546 *Національний університет "Києво-Могилянська академія"*

Підстава: Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-LX

- 1) З Державного бюджету за 2201240 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м Києва"

виділено 15 000 000 грн., у тому числі на :

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
видатки споживання - разом, з них:	0	0	0
оплата праці	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0
видатки розвитку	15 000 000	15 000 000	0
повернення кредитів до бюджету	0	0	0
надання кредитів із бюджету	0	0	0
у с ь о г о	15 000 000	15 000 000	0

- 2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

середньорічної чисельності працівників ставок,

з них викладачів ставок;

- 3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:

<i>січень</i> 0	<i>лютий</i> 0	<i>березень</i> 0	<i>квітень</i> 2 000 000	<i>травень</i> 2 000 000	<i>червень</i> 1 000 000
<i>липень</i> 2 000 000	<i>серпень</i> 2 000 000	<i>вересень</i> 2 000 000	<i>жовтень</i> 2 000 000	<i>листопад</i> 1 000 000	<i>грудень</i> 1 000 000

- 4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), платного розпису установи на 2021 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 29 січня 2021 року



С. В. Даниленко



Фото 1-2.Реставрація фасадів та ганку церкви 2021р.

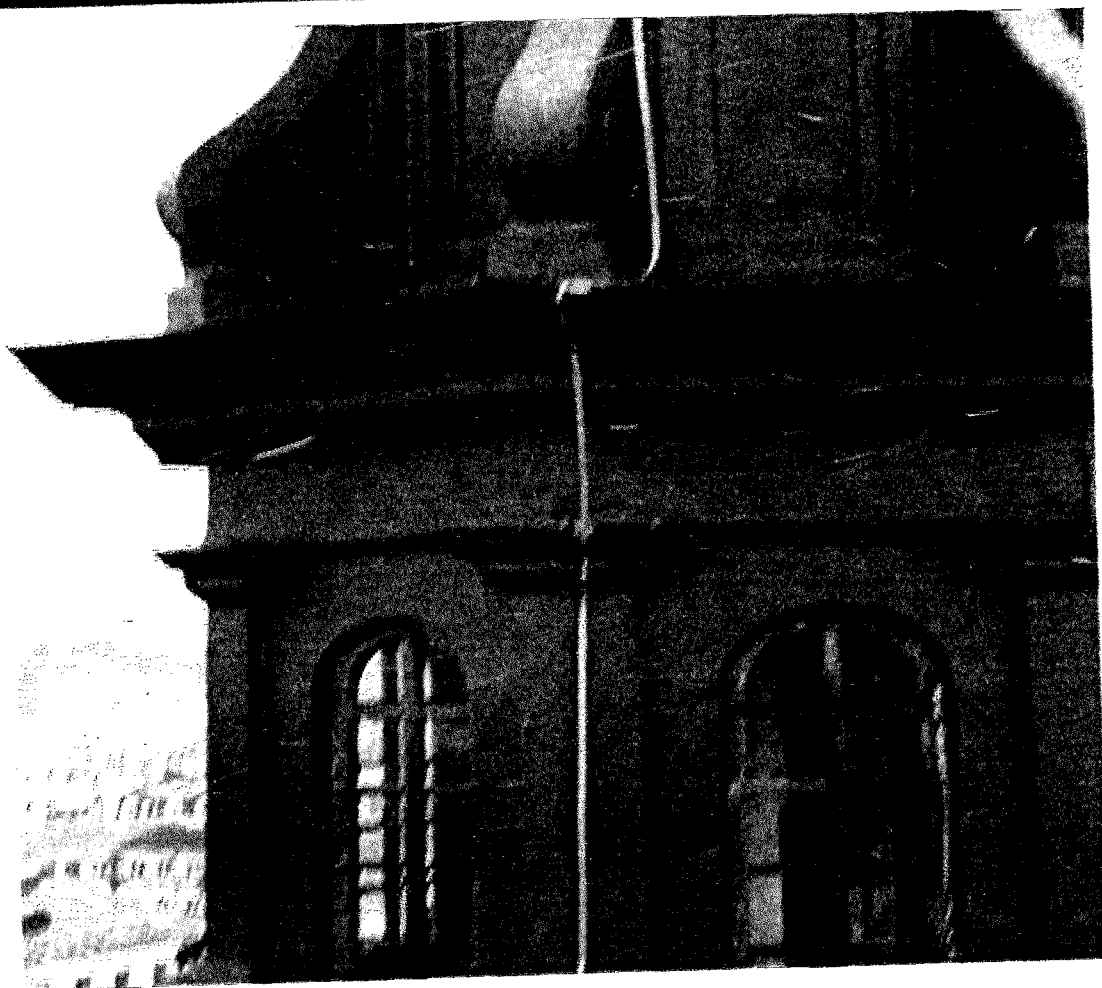
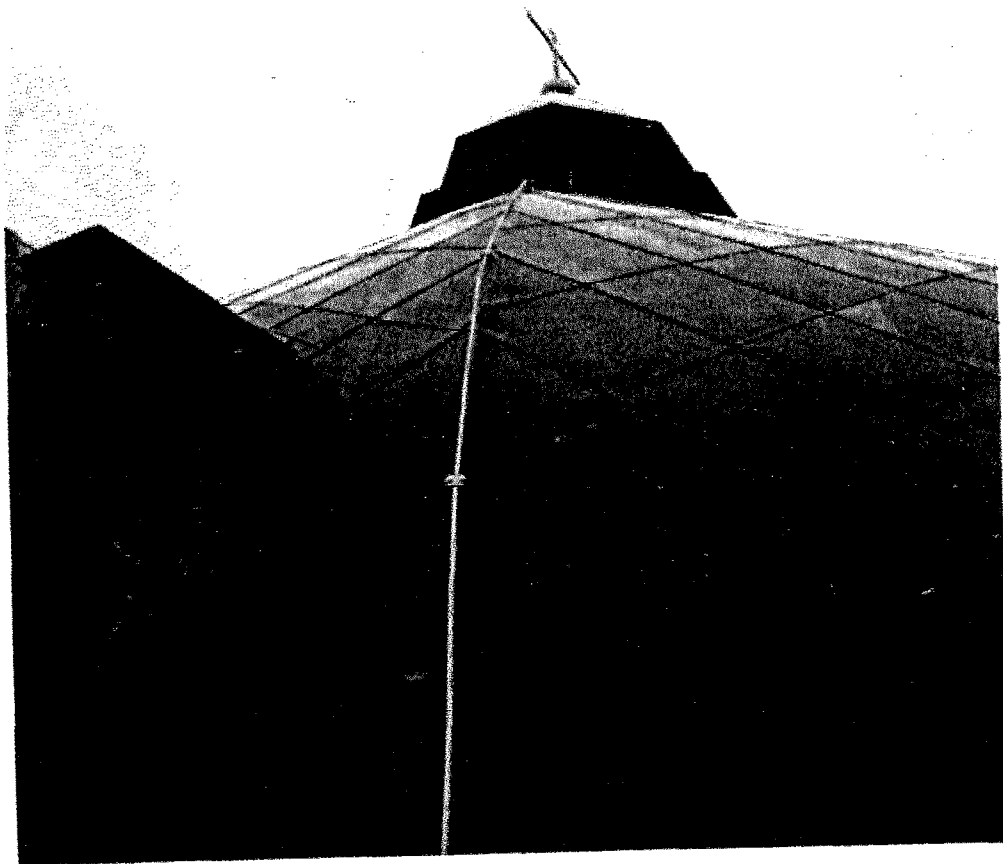


Фото 3,4. Блисковозахист 2021 р.



Фото 5,6 . Реставрація фасадів з заміною вікон 2021 р.

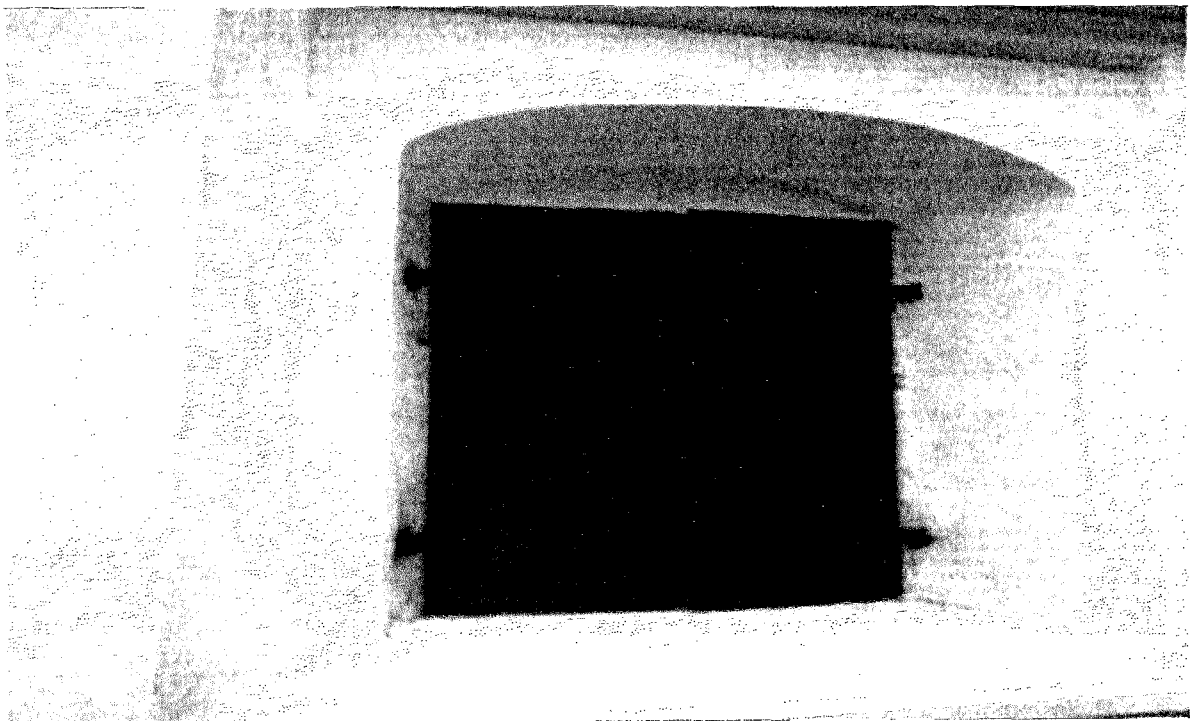


Фото 7,8. Реставрація фасадів з улаштуванням ставень 2021 р.




Фото 11.

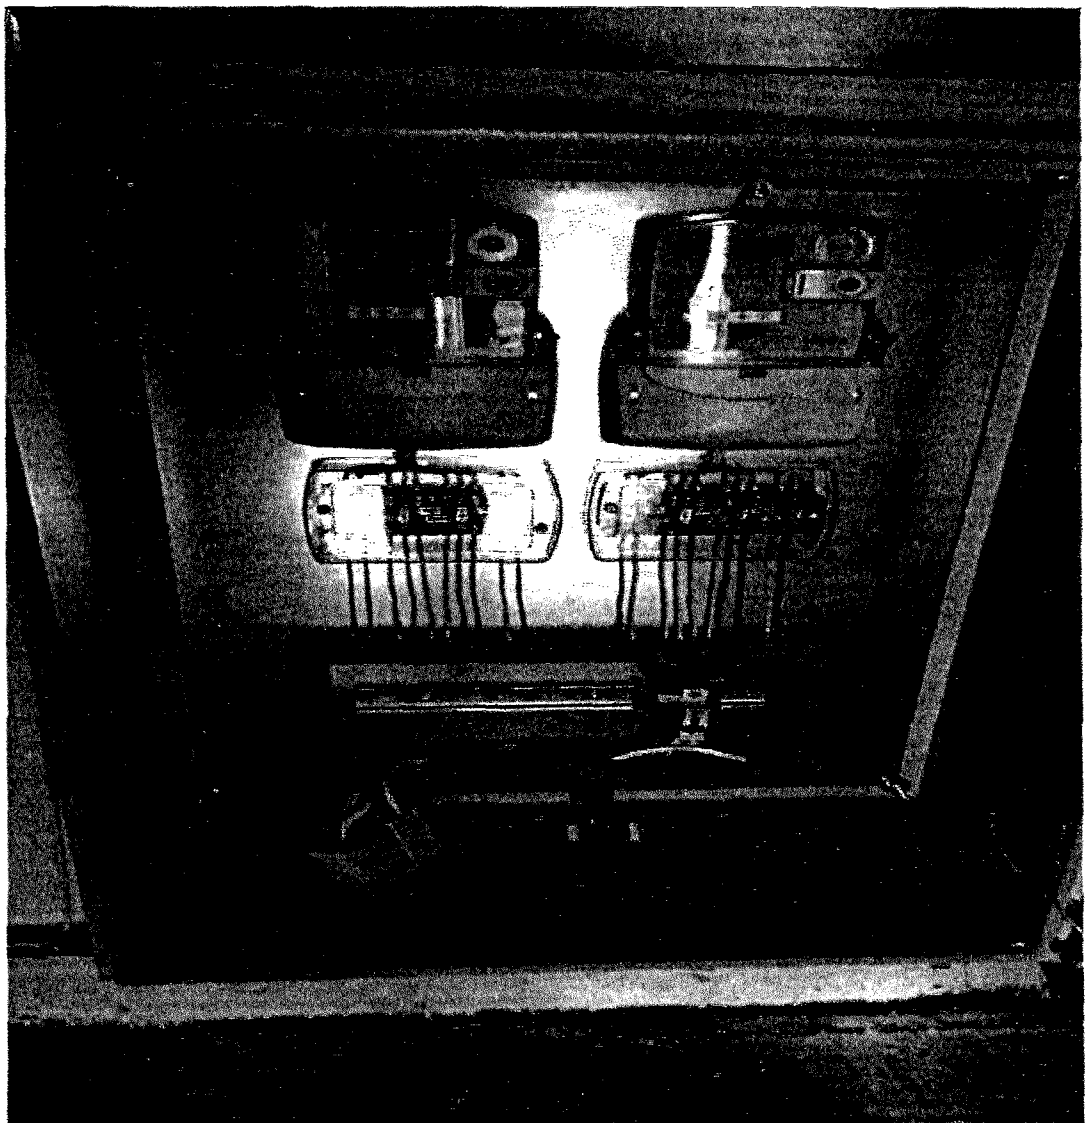


Фото 9-12. Вентиляційне обладнання 2021 р.
